


# RONDA DE DALT

## TRAM 1. FASE 2

Maig 2024

---



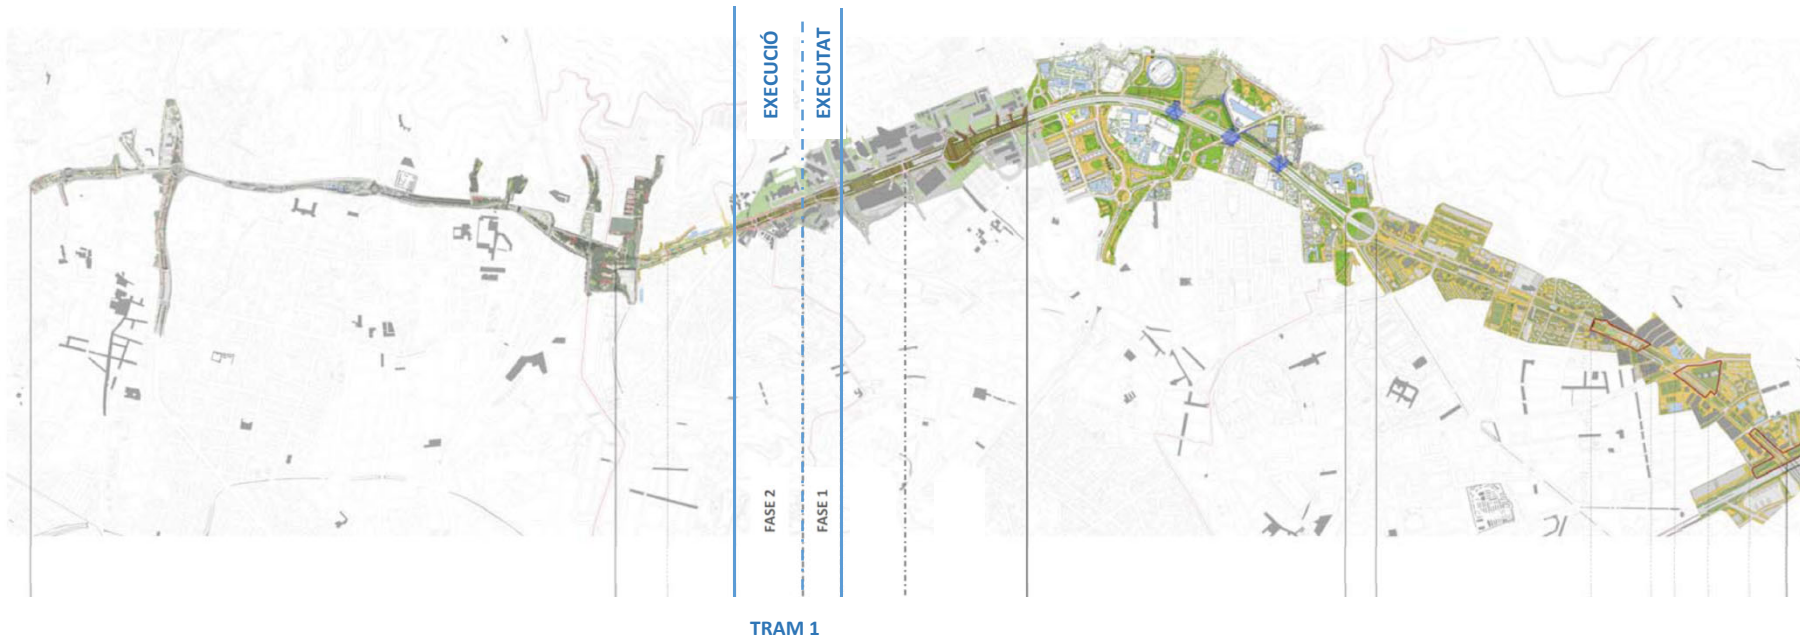


## ACTUACIONS A LA RONDA DE DALT DE BARCELONA



# COBERTURA I URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA RONDA DE DALT. TRAM 1

**ACTUACIÓ:** Cobertura i urbanització de la cobertura de la Ronda de Dalt

**TRAM 1:** AV. VALLCARCA – AV. JORDÀ

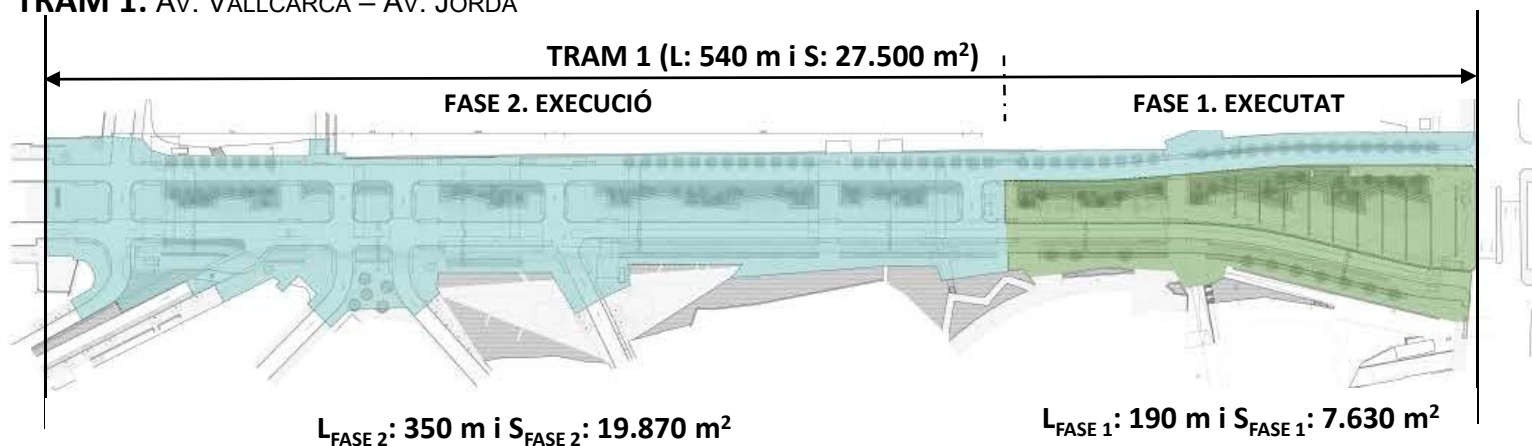

## FASE 2

### 3 "OBRES" DIFERENCIADES:

- ESTRUCTURA. **OBRES** (INV. 18,6 M€)
- INSTAL·LACIONS. PROJECTE EN REDACCIÓ (INV. 12,6 M€)
- URBANITZACIÓ. PROJECTE EN REDACCIÓ (INV. 9,8 M€)

LONGITUD ≈ 340 M

INVERSIÓ NECESSÀRIA: 41 M€

## FASE 1

OBRA DE COBERTURA FINALITZADA (INV. 12,04M€)

OBRA D'URBANITZACIÓ FINALITZADA (INV. 5,28M€)

LONGITUD ≈ 200 M

INVERSIÓ REALITZADA: 17,32 M€





Ajuntament  
de Barcelona

# PROJECTE DE COBERTURA (ESTRUCTURA) RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2A

**ACTUACIÓ:** Mur i Sortides emergència

**ESTAT DE L'ACTUACIÓ:** INICI OBRES JUNY'24. DURADA 21 MESOS (MARÇ'26)

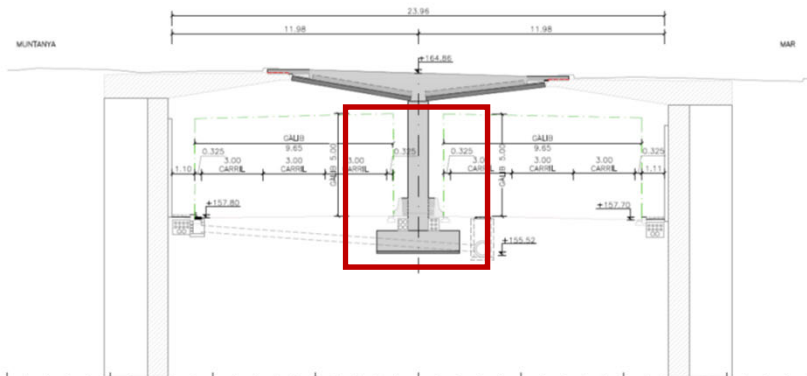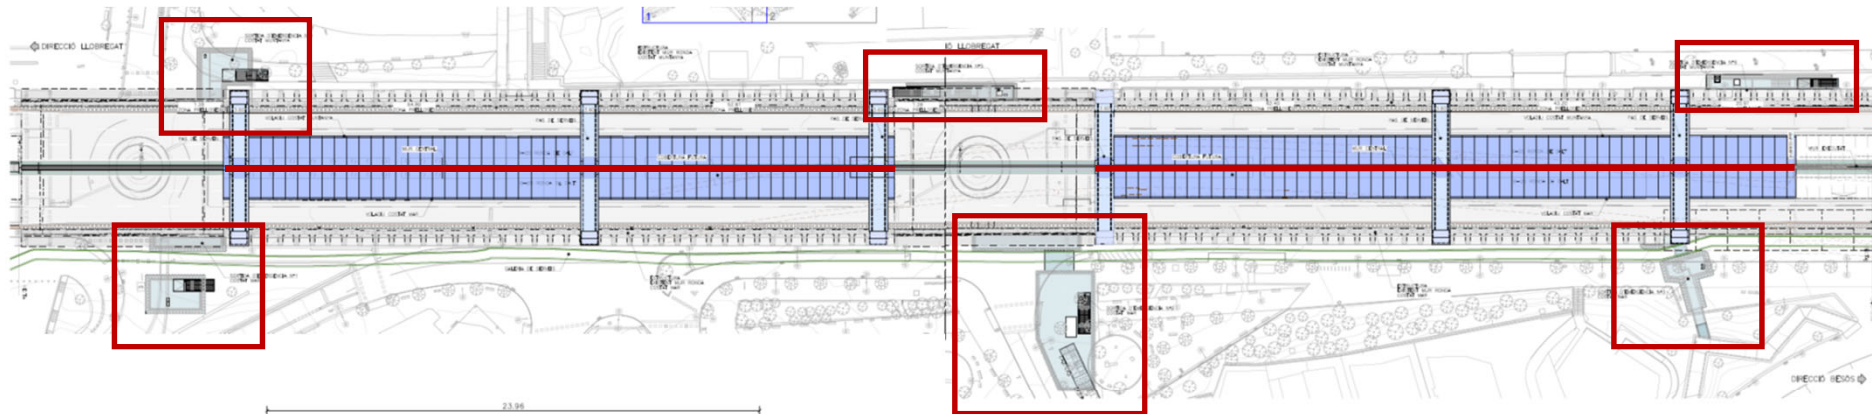

 **FASE 2A. MUR CENTRAL I SORTIDES D'EMERGÈNCIA**





Ajuntament  
de Barcelona

# PROJECTE DE COBERTURA (ESTRUCTURA) RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2B

**ACTUACIÓ:** Cobertura + instal·lacions.

**ESTAT DE L'ACTUACIÓ:** PROJECTE APROVAT. **LICITACIÓ OBRA FASE 2B:** DESEMBRE 24

**OBRA FASE 2B:** INICI PREVIST JUNY 25. DURADA 23,5 MESOS (MAIG 27)

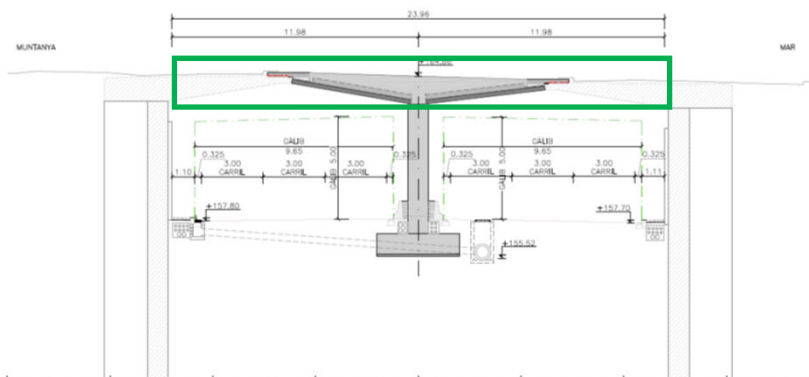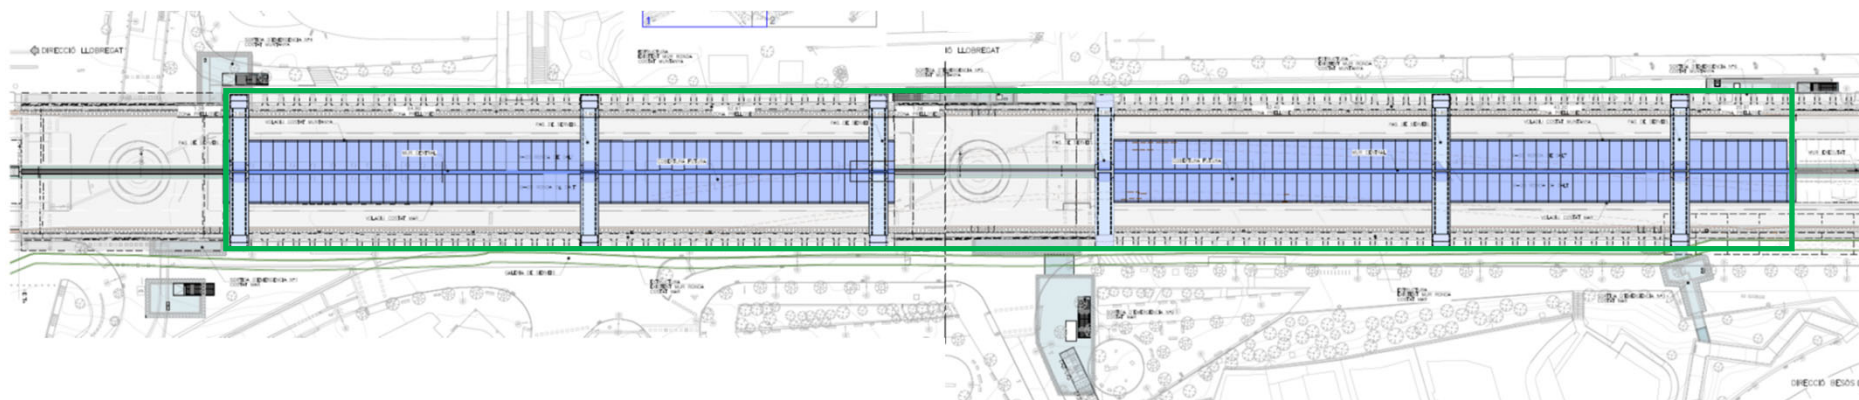

 **FASE 2B. COBERTA (EXECUCIÓ AMB INSTAL·LACIONS)**




Ajuntament  
de Barcelona

# PROJECTE DE COBERTURA (INSTAL·LACIONS) RONDA DE DALT. TRAM 1. FASES 1 I 2

**ACTUACIÓ:** Cobertura + instal·lacions (Fases 1+2).

**ESTAT DE L'ACTUACIÓ:** PROJECTE EN ACTUALITZACIÓ. LICITACIÓ OBRA FASE 2B: DESEMBRE 24

**OBRA FASE 2B:** INICI PREVIST JUNY 25. DURADA 23,5 MESOS (MAIG 27)

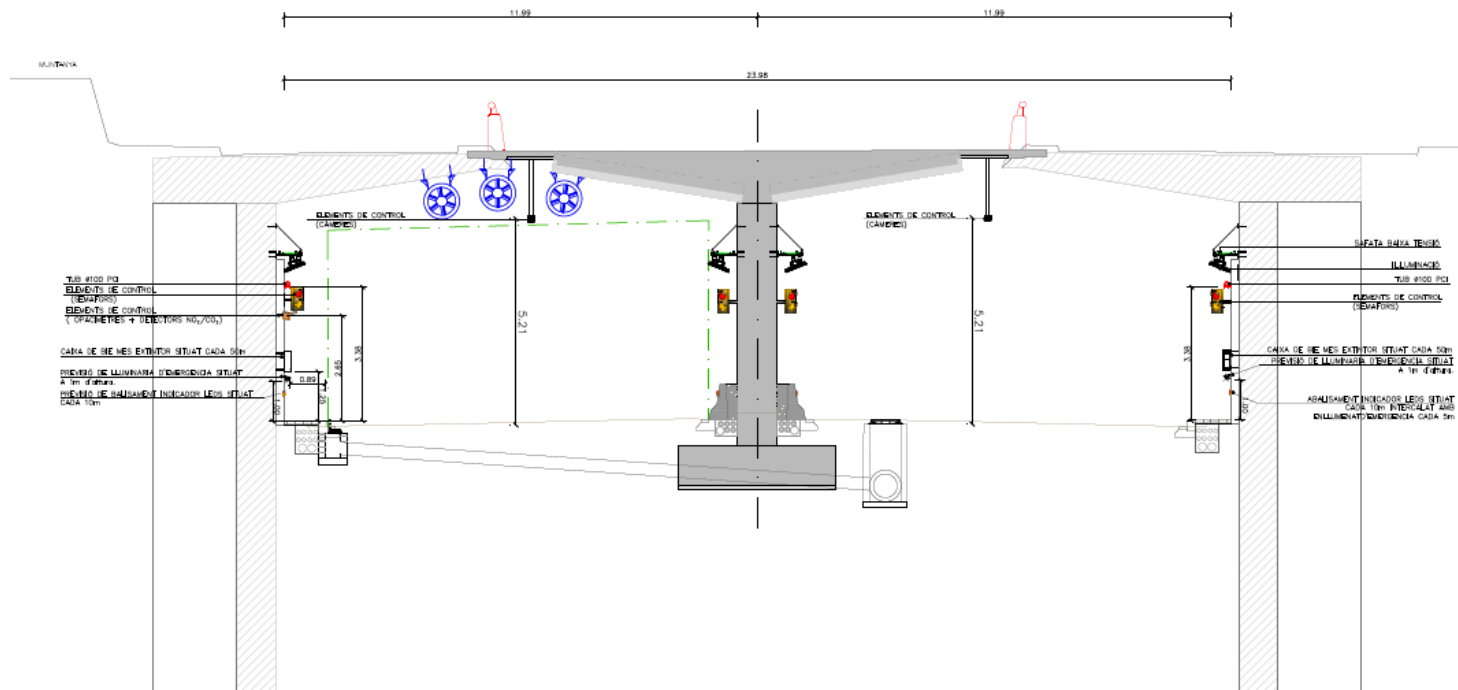



Ajuntament  
de Barcelona


## PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2

**ACTUACIÓ:** Urbanització de la cobertura de la Ronda de Dalt

**ESTAT DE L'ACTUACIÓ:** PROJECTE EN REDACCIÓ. **INICI PARTICIPACIÓ:** TARDOR 2024

**LICITACIÓ OBRA URBANITZACIÓ:** DESEMBRE 26.


**INICI OBRA URBANITZACIÓ:** JUNY 27 I DURADA 12 MESOS (MAIG 28)

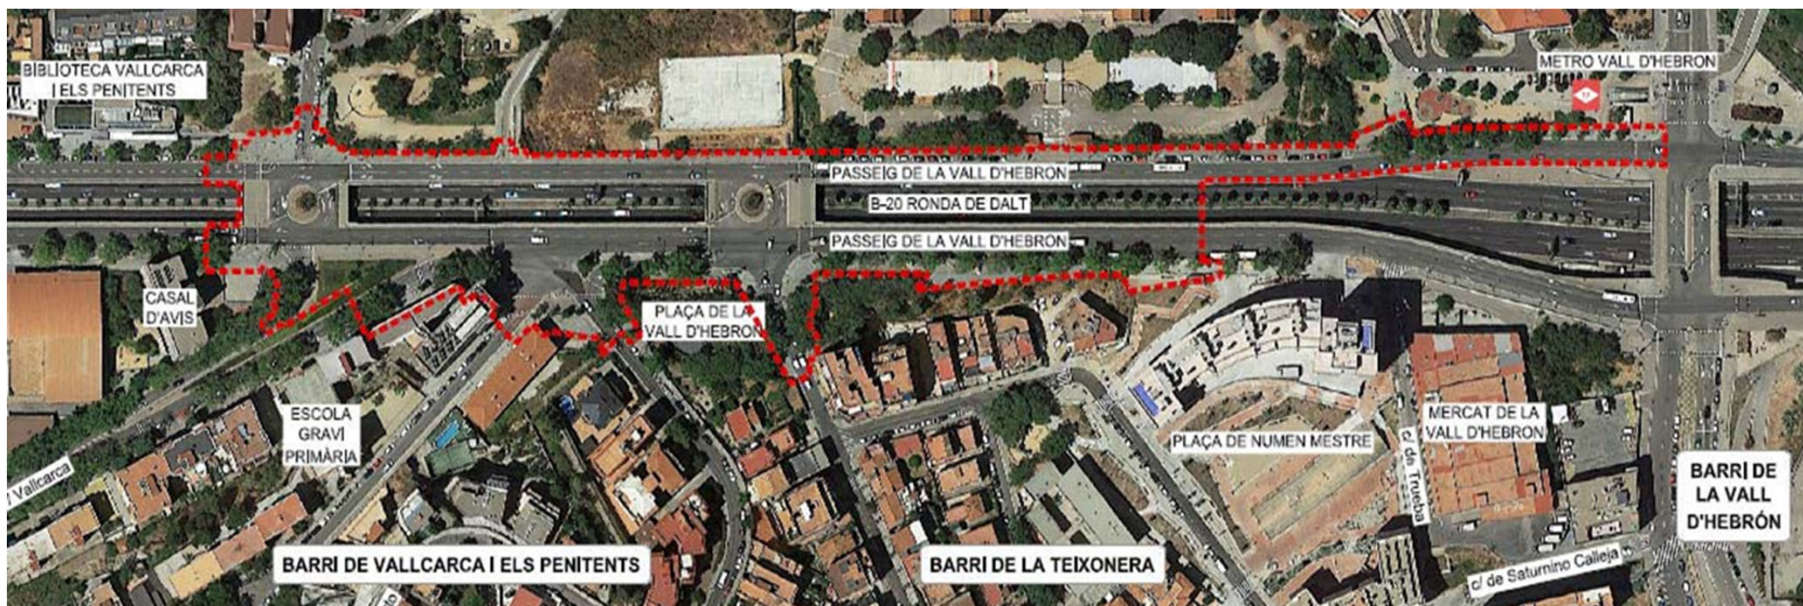




Ajuntament  
de Barcelona

## OBRA ESTRUCTURA RONDA DE DALT.TRAM 1.FASE 2A

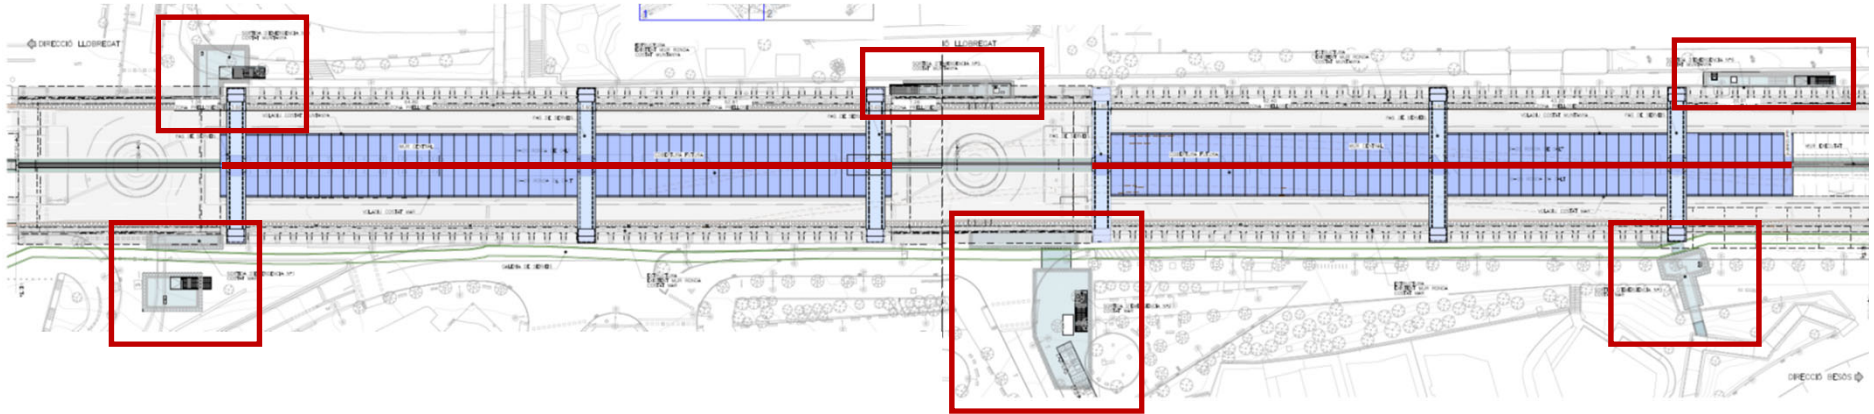

 **FASE 2A. MUR CENTRAL I SORTIDES D'EMERGÈNCIA**

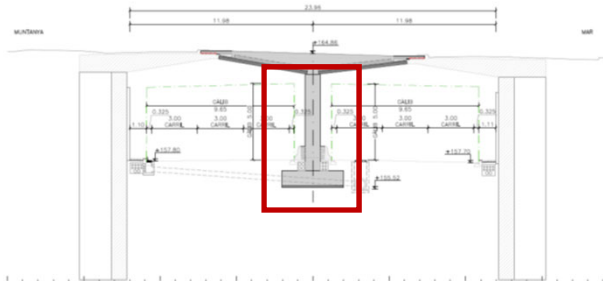





## **OBRA ESTRUCTURA RONDA DE DALT. TRAM 1.FASE 2A**

### ➤ **PRESSUPOSTOS:**

- **PCA : 11.331.091,09 €**
  - **INCLOU SERVEIS ADDICIONALS DE:**
    - **AUSCULTACIÓ**
    - **CONTROL QUALITAT**
    - **DESVIAMENT SERVEIS AFECTATS COMPANYIES**

### ➤ **TERMINI D'EXECUCIÓ OBRES FASE 2A: 21 MESOS**

- **DATA INICI: JUNY 2024**
- **DATA FINALITZACIÓ : MARÇ 2026**

### ➤ **AGENTS:**

- **GESTOR: BIMSA**
- **DIRECCIÓ D'OBRA : MASTERPLAN**
- **CONTRACTISTA: UTE MJ GRUAS – CONTRATAS VILOR**

### ➤ **SINGULARITATS:**

- **GRAN QUANTITAT DE SSAA:** AGBAR, NEDGIA, ENDESA, TELEFÓNICA, JAZZTEL, TELECOMUNICACIONS (CMC I IMI), XARXA ITS MOBILITAT, ENLLUMENAT, SEMAFORITZACIÓ, CLAVEGUERAM,....
- **REQUERIMENTS:** AUTORITZACIÓ DGIM (L3 METRO) I SEGUIMENT ADCOGASE (GALERIA)
- **IMPORTANT AFECCIÓ MOBILITAT TRONC CENTRAL RONDA:** TALLS CARRILS ESQUERRES PER CONSTRUCCIÓ MUR, CARRILS DRETS PER EMBOCAMENT SORTIDES EMERGÈNCIA. ALS ESTIUS.
- **TREBALLS NOCTURNS TRONC CENTRAL:** ACTIVITATS MENYS SOROLLOSES
- **TALL TOTAL DE LA RONDA NITS PUNTUALS**



Ajuntament  
de Barcelona


## OBRA ESTRUCTURA RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2A

TRONC CENTRAL .FASE PREVIA. TRANSPLANTAMENTS I DESVIAMENTS SERVEIS. MAIG 2024.  
NOCTURN. TALL TOTAL.

### COM HO FAREM?

EXPERIENCIA FASE 1.

TRANSPLANTAMENTS I DESVIAMENT SERVEIS

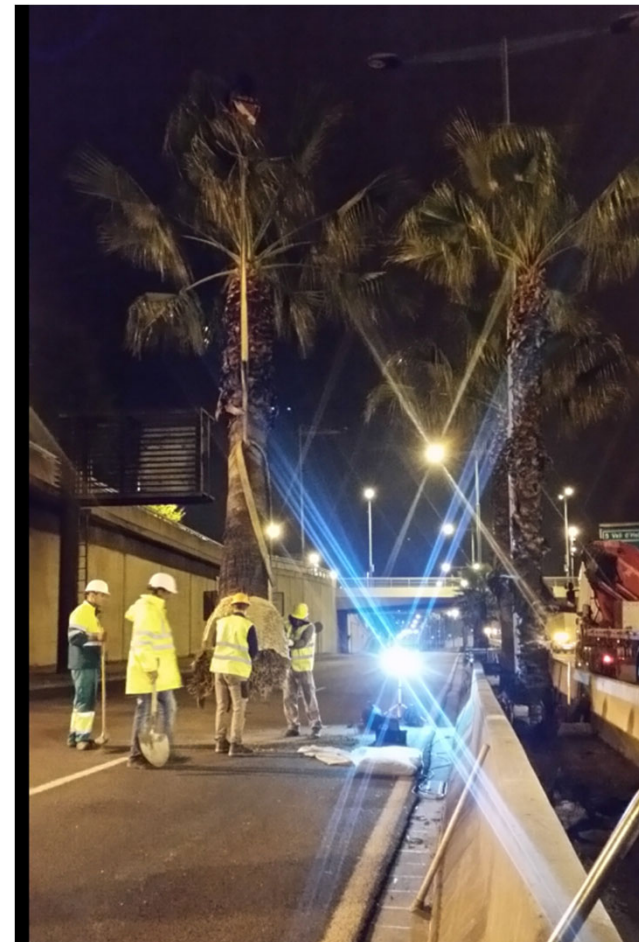



Ajuntament  
de Barcelona

## OBRA ESTRUCTURA RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2A

TRONC CENTRAL .ESTRUCTURA. ESTIU 2024 + ESTIU 2025



**COM HO FAREM?**

EXPERIENCIA FASE 1.

DESVIAMENTS TRÀNSIT

**COM HO FAREM?**

EXPERIENCIA FASE 1.

ENDERROCS





Ajuntament  
de Barcelona

## OBRA ESTRUCTURA RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2A

TRONC CENTRAL .ESTRUCTURA. ESTIU 2024 + ESTIU 2025



**COM HO FAREM?**

EXPERIENCIA FASE 1.

FONAMENTS PROFUNDS. PILOTS

**COM HO FAREM?**

EXPERIENCIA FASE 1.

FONAMENTS SUPERFICIALS.

SABATES MUR





Ajuntament  
de Barcelona

## OBRA ESTRUCTURA RONDA DE DALT.TRAM 1.FASE 2A

TRONC CENTRAL .ESTRUCTURA. ESTIU 2024 + ESTIU 2025



**COM HO FAREM?**

EXPERIENCIA FASE 1.

MUR

**COM HO FAREM?**

EXPERIENCIA FASE 1.


BARRERES I RESTITUCIÓ TRÀNSIT








# OBRA ESTRUCTURA RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2A

SORTIDES EMERGÈNCIA COSTAT MAR. JUNY 2024 A AGOST 2025

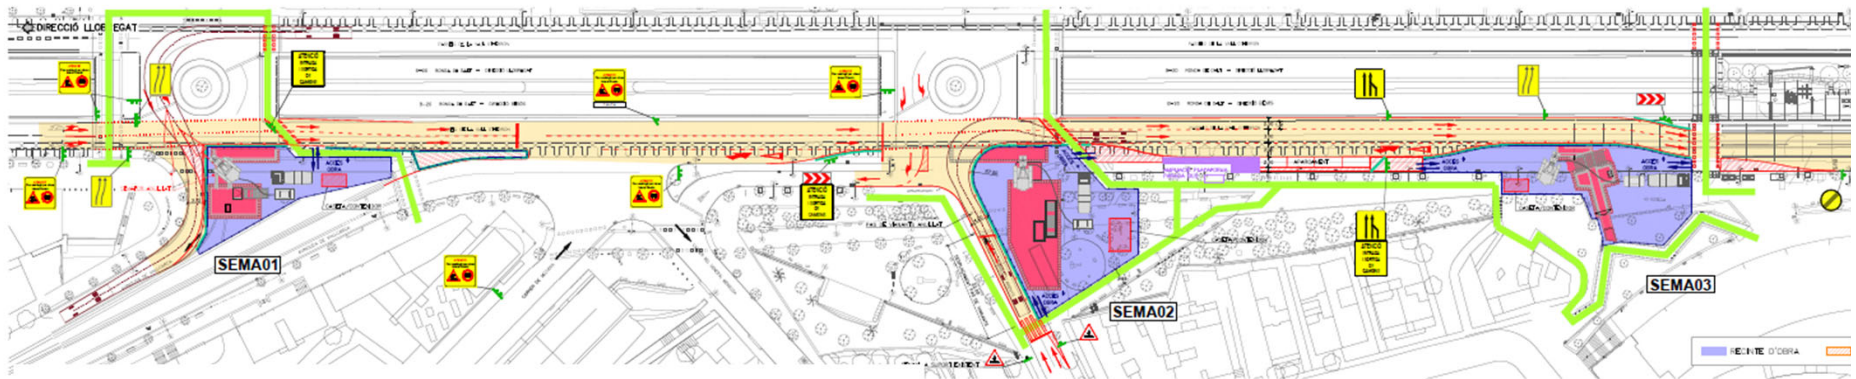

SECCIÓ TRANSVERSAL REPRESENTATIVA

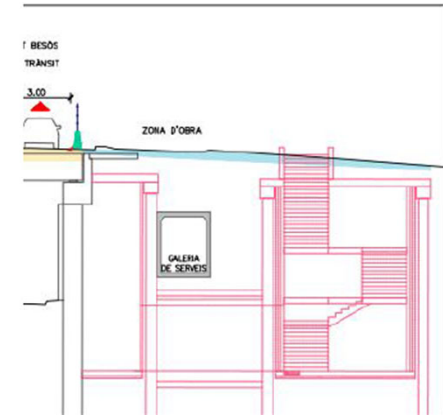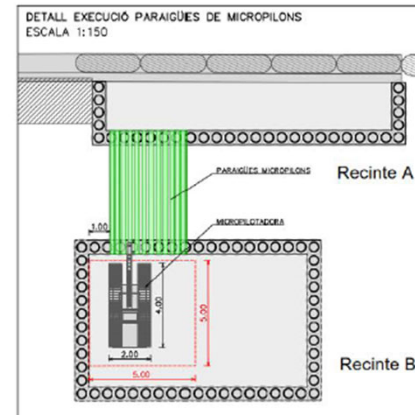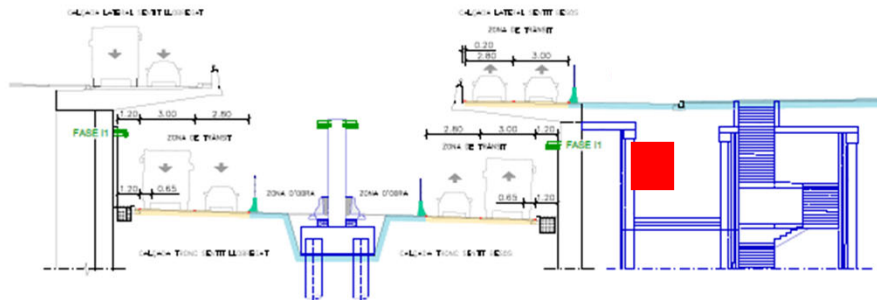

## COM HO FAREM?

DESVIAMENTS TRANSIT I VIANANTS.

DESVIAMENTS SERVEIS.

PANTALLES I PILOTS


EXCAVACIÓ RECINTE

ESTRUCTURA I INSTAL·LACIONS INTERIORS




# OBRA ESTRUCTURA RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2A

SORTIDES EMERGÈNCIA COSTAT MUNTANYA. AGOST 2025 A MARÇ 2026

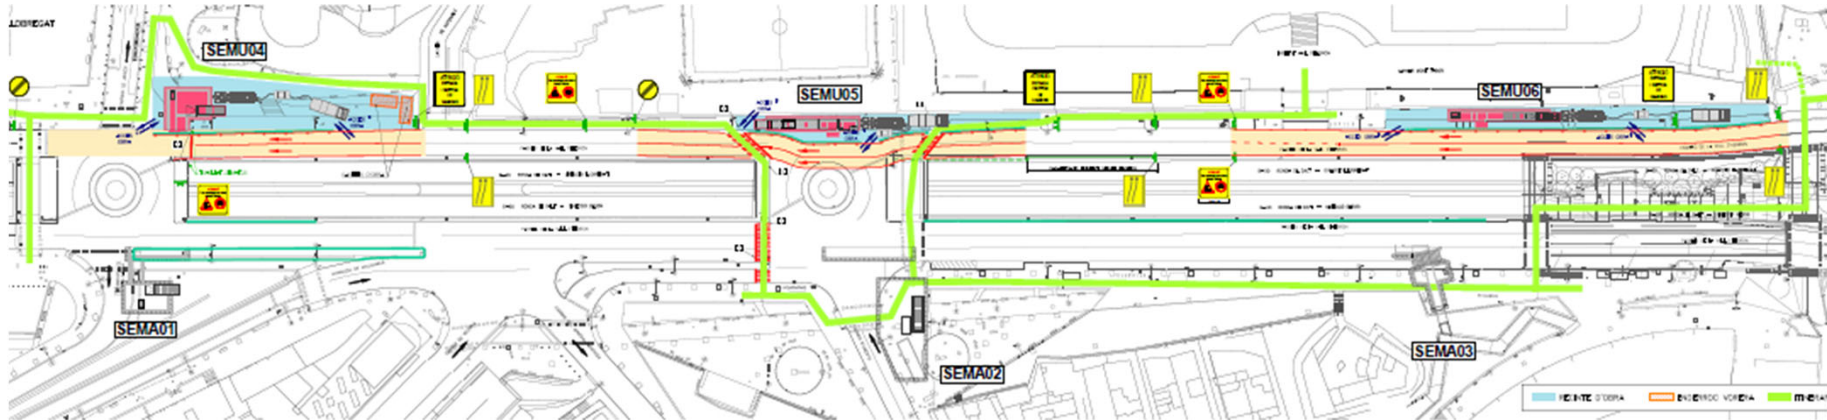

## SECCIÓ TRANSVERSAL REPRESENTATIVA

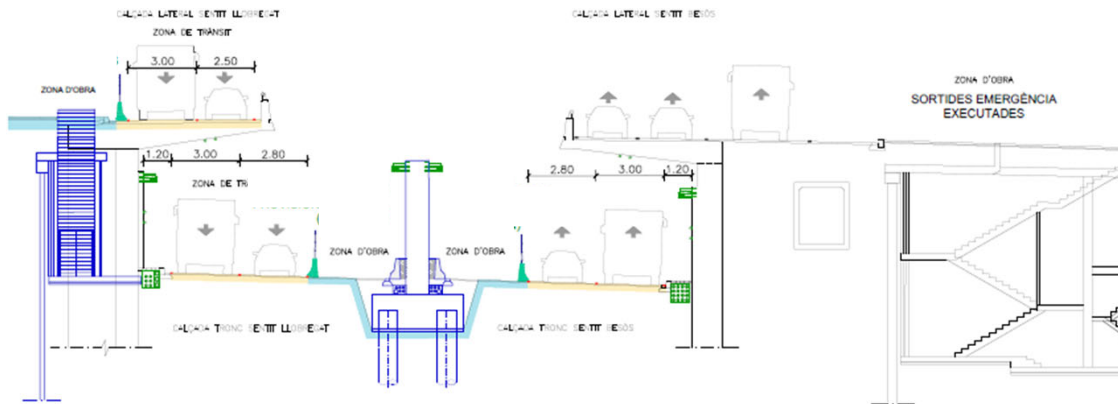

## COM HO FAREM?

DESVIAMENTS TRANSIT I VIANANTS.

DESVIAMENTS SERVEIS.

PANTALLES I PILOTS

EXCAVACIÓ RECINTE

ESTRUCTURA I INSTAL·LACIONS  
INTERIORS

**Gràcies per la vostra col·laboració!**



**Ajuntament  
de Barcelona**
